

# Un an de retard pour la fibre optique

**Lancés en février 2018, les travaux de déploiement de la fibre sur le territoire auraient dû être achevés en début d'année 2019. À ce jour, ils ne le sont toujours pas.**

Sabrina Vernade

sabrina.vernade@centralfaence.com

**U**n an. Un an que les habitants du territoire des Villages de la forêt – Nancay, Vouzuron, Neuville-sur-Barangeon, Vignoux-sur-Barangeon et Saint-Laurent – auraient dû pouvoir se raccorder à la fibre optique. Et bénéficier enfin d'une connexion internet à très haut débit.

« Les travaux de déploiement de la fibre optique, lancés en février 2018, auraient dû être terminés à la fin du troisième trimestre 2018, rappelle Ghislaine Jenneau, la présidente de la communauté de communes des Villages de la forêt, pour une commercialisation prévue en décembre 2018 ou janvier 2019. »

## Une étude à refaire

Ce retard s'explique de plusieurs façons. Tout d'abord, au moment de lancer les travaux, l'entreprise Eiffage, prestataire missionnée par Berry numérique, s'est rendu compte « que les plans fournis par le bureau d'études ne correspondaient pas au terrain, qu'il y avait de grosses différences, des poteaux mal positionnés par exemple », explique la présidente. Le bu-

reau d'études de Eiffage a donc dû reprendre entièrement l'étude d'exécution sur le terrain.

Mais, une fois les plans en main, « l'entreprise a eu des difficultés à prendre en charge le chantier », indique Pascal Bourdillon, le directeur de Berry numérique, pour des problèmes de personnel notamment. « Je pense aussi que les plannings annoncés étaient très optimistes, poursuit le directeur. C'est

la première plaque d'action est

compliquée. Tout le monde pense que c'est relativement facile, mais déployer la fibre en zone rurale, ce n'est pas facile. »

Pour la communauté de commerçants, il s'agit pourtant d'un investissement considérable, de 676.000 euros hors taxes (soit 20 % du coût total du chantier),

qui n'ont pas été pris en compte.

**FIBRE OPTIQUE.** Les habitants du territoire des Villages de la forêt attendent avec impatience d'être enfin raccordés et d'enfin bénéficier d'une connexion digne de ce nom. PHOTO D'ILLUSTRATION LA MONTAGNE

**« Une année de retard pour la fibre, ce n'est pas si inhabituel »**


À ce jour, le réseau souterrain est tiré, le transport et la collecte sont raccordés. « Il reste beaucoup de travail sur le réseau aérien. Et l'implantation des poteaux est en cours sur Vignoux-sur-Barangeon et Neuville-sur-Barangeon », détaille la présidente. La commune de Vignoux devrait d'ailleurs être la première à être raccordée.

Pour les autres communes,

« des poteaux ont été plantés,

mais il se pourrait que leur im-

plantation soit modifiée »... ■

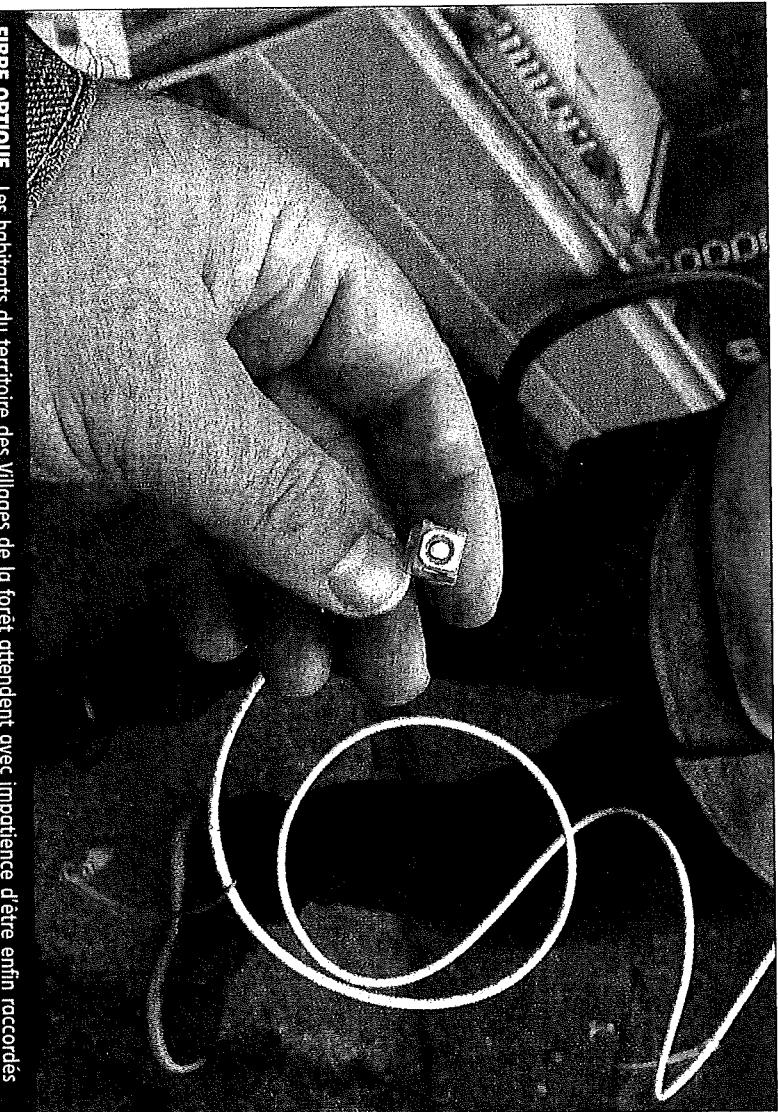

Bourdillon, mais on a tout fait de notre côté pour que ça avance, on a rappelé l'entreprise à l'ordre à plusieurs reprises, on a rencontré le patron, le chef du patron... » Il rappelle toutefois « qu'une année de retard pour la fibre, ce n'est pas si inhabituel. » Et que solliciter un nouveau prestataire pour reprendre le chantier repousserait encore l'échéance.

Quant à l'entreprise Eiffage,

solicitée par notre rédaction, elle n'a pas souhaité répondre.

Elle s'est en tout cas engagée

à fin décembre 2019, « mais

nos doutes réellement de leur capacité à tenir un tel plan-

ning compte tenu des antécé-

dents », estime la présidente.
